

BYGGEPOSTEN STEN

GALGEBAKKEN

AUGUST 2022




NY TIDSPLAN FOR RENOVERINGEN

Desværre er der forsinkelser, og derfor får du her en ny og opdateret tidsplan for renoveringen. Læs hvorfor der er forsinkelser, og hvordan det påvirker din genhusning og tilbageflytning.

HVORFOR ER DER FORSINKELSER?

Helhedsplanen for Galgebakken er én af Danmarkshistoriens største renoveringer.

Desværre har det taget længere tid end forventet at få materialer. Derudover har der været udfordringer med afløb i kældrene, og det har været vanskeligere end forventet at få overblik over de mange arbejdsgange, der er i renoveringen. Alt sammen ting som gør, at tidsplanen ikke længere kan holdes.



FORSINKET, MEN IKKE GÅET I STÅ

Selvom tidsplanen er forsinket, betyder det ikke, at renoveringen er gået i stå. 150 håndværkere har hver dag deres gang på byggepladsen. I Skrånt 1-3 er der kommet tag på boligerne, der bliver sat fliser op på badeværelserne og lagt gulve. I Skrånt 2-6 bliver der arbejdet på sokler, facader og VVS. Og i Mark og Sten er nedrivningen i gang.

HVOR MEGET ER RENOVERINGEN FORSINKET?

Forsinkelsen er på omkring otte uger på både genhusning og tilbageflytning. Så hurtigt som muligt får du et brev eller en e-mail fra os i BO-VEST med de nøjagtige datoer, der gælder for dig.

Efter nytår starter renoveringen i de lige numre i Vester (2, 4, 6 og 8). Forventningen er, at renoveringen herefter vil holde tidsplanen med en genhusningsperiode på 6-8 måneder.

ER DEN NYE TIDSPLAN ENDELIG?

Vi prøver så godt det er muligt at give dig en dato for, hvornår du skal genhuses, og hvornår du kan flytte tilbage til din renoverede bolig.


Når det er sagt, så kan der komme nye ændringer. Derfor beder vi dig være opmærksom på, at der også til denne tidsplan kan ske justeringer.

I DETTE NUMMER AF BYGGEPOSTEN:

- FORSINKELSER
- NY TIDSPLAN FOR RENOVERINGEN
- FLYTNING I PULJER

HUSK! GALGEBAKKEN- RENOVERING.DK

HER KAN DU BL.A. SE
DEN OPDATEREDE
TIDSPLAN FOR HELE
GALGEBAKKEN

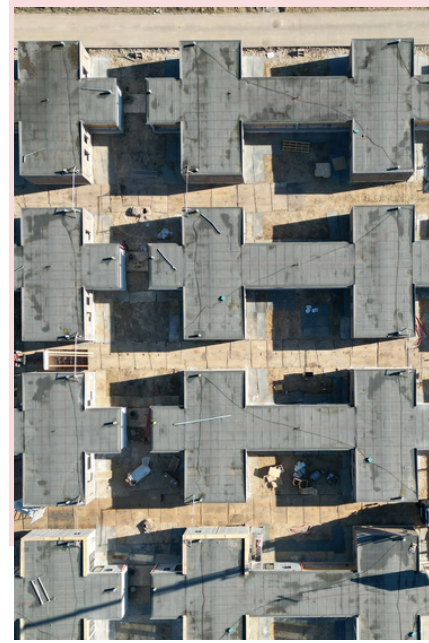

Ny tidsplan for renoveringen

Adresse	Genhusning senest	Tidligste tilbageflytning	Seneste tilbageflytning
---------	-------------------	---------------------------	-------------------------

Skrænt 1 og 3	Start januar 2022	Slut oktober 2022	Start december 2022
Skrænt 2, 4 og 6	Slut februar 2022	Start december 2022	Midt januar 2023

Mark 2, 4 og 6	Slut april 2022	Slut januar 2023	Slut februar 2023
----------------	-----------------	------------------	-------------------

Sten 2, 4 og 6	Start juni 2022	Midt marts 2023	Midt april 2023
----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Vester 1, 3, 5, 7 og 9	Start august 2022	Slut marts 2023	Midt juni 2023
Vester 2, 4, 6 og 8	Start december 2022	Slut juni 2023	Slut september 2023


Torv, 1, 3, 5	Start april 2023	Slut oktober 2023	Slut januar 2024
Torv 7 og 9	Start august 2023	Midt februar 2024	Slut marts 2024

Sønder 2, 4, 6 og 8	Slut september 2023	Midt april 2024	Slut juli 2024
Sønder 1, 3, 5, 7 og 9	Midt januar 2024	Midt august 2024	Start oktober 2024

Neder 2, 4, 6, 8 og 10	Midt marts 2024	Start oktober 2024	Slut november 2024
Neder 1, 3, 5, 7 og 9	Midt maj 2024	Start december 2024	Slut januar 2025

Over 2, 4, 6 og 8	Start august 2024	Midt februar 2025	Slut marts 2025
Over 1, 3, 5, 7 og 9	Slut september 2025	Midt april 2025	Slut maj 2025

Øster 2, 4, 6, 8, 10	Slut november 2024	Midt maj 2025	Midt august 2025
Øster 7 og 9	Slut januar 2025	Slut august 2025	Slut september 2025



FLYTNING I PULJER

Når du skal flytte tilbage til din bolig, sker det i såkaldte puljer.

Her bliver otte boliger klar hver 14. dag til at tage imod nye beboere. Det gør, at du ikke altid flytter hjem på samme dato som din nabo.
